


Projektmanagement und Projektphasen

Phasen eines Projekts (Definition, Planung, Durchführung, Abschluss) sowie typische Werkzeuge wie Projektstrukturplan und Projektablaufplan.

 In 4 von 16 Aufgabensammlungen geprüft

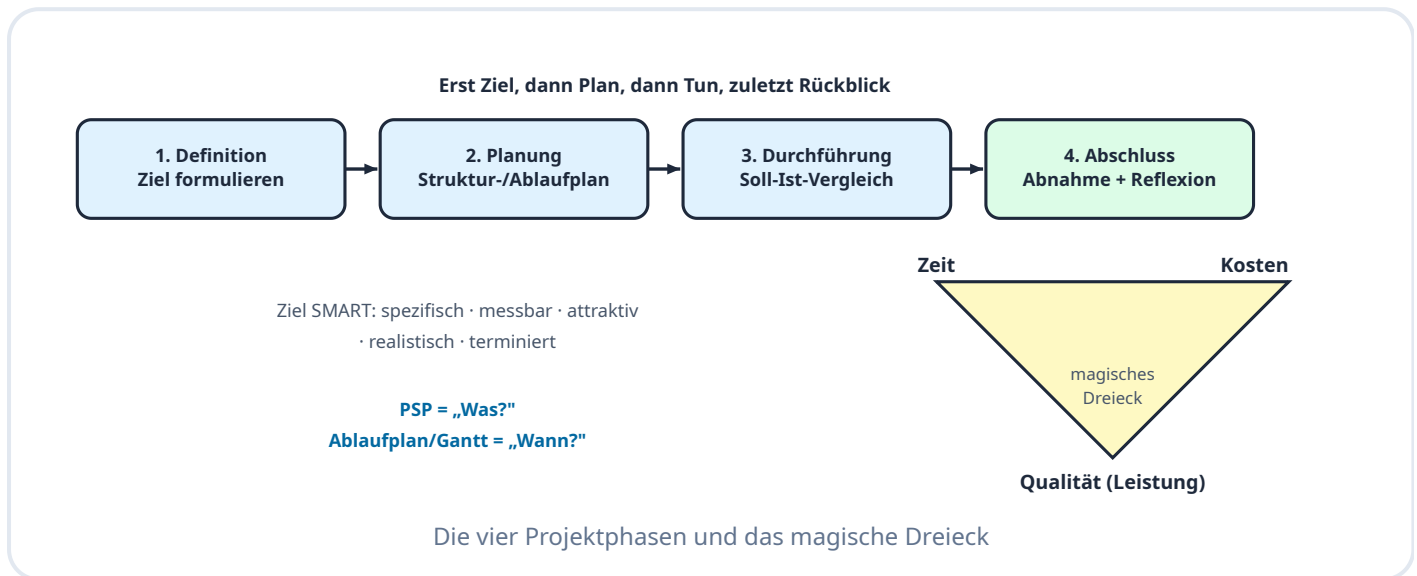

Was ist ein Projekt?

Ein **Projekt** ist ein einmaliges Vorhaben mit klarem Ziel, begrenzten Ressourcen sowie festem Anfang und Ende. Es unterscheidet sich von der Routinearbeit durch seine **Einmaligkeit** und **Komplexität**.

Merkmale eines Projekts:

- **einmalig / neuartig** (keine Daueraufgabe),
- **zeitlich befristet** (fester Start- und Endtermin),
- **begrenzte Ressourcen** (Budget, Personal),
- **klares Ziel** und meist **abteilungsübergreifend**.

Für die Bearbeitung wird häufig eine **Projektgruppe** eingerichtet, die von einer **Projektleitung** gesteuert wird.

Merke: Was regelmäßig und gleich abläuft, ist kein Projekt – ein Projekt ist einmalig, befristet und zielgerichtet.

Die vier Projektphasen

Das Projektmanagement gliedert den Ablauf in aufeinander folgende Phasen:

1. **Definition** (Initiierung): Das **Projektziel wird formuliert**, der Auftrag geklärt, der Rahmen abgesteckt (Zeit, Kosten, Umfang).

2. **Planung:** Es werden **Projektstrukturplan** (Zerlegung in Teilaufgaben) und **Projektablaufplan** (zeitliche Reihenfolge) erstellt; Ressourcen und Termine werden festgelegt.
3. **Durchführung** (Realisierung): Die Aufgaben werden umgesetzt, die **Fortschritte dokumentiert** und überwacht (Soll-Ist-Vergleich).
4. **Abschluss:** Ergebnisse werden übergeben, das Projekt abgenommen, danach folgt die **Reflexion** (Auswertung, Lessons Learned).

Beispiel Zuordnung: „Ziel und Auftrag klären“ → Definition · „Strukturplan erstellen“ → Planung · „Arbeitspakete umsetzen“ → Durchführung · „Abschlussbericht schreiben“ → Abschluss.

Merke: Erst das Ziel (Definition), dann der Plan (Planung), dann das Tun (Durchführung), zuletzt der Rückblick (Abschluss).

Ziele richtig formulieren: SMART

Ein gutes Projektziel ist **SMART** formuliert – das vermeidet Missverständnisse und macht den Erfolg messbar:

Buchstabe	Bedeutung
S	spezifisch (konkret)
M	messbar
A	attraktiv / akzeptiert
R	realistisch
T	terminiert

Beispiel: Statt „Wir wollen die Lagerhaltung verbessern“ heißt es SMART: „Bis zum 30.06. senken wir die durchschnittliche Lagerdauer von 40 auf 30 Tage.“

Merke: Ein Ziel ohne Termin und Messgröße ist kein Ziel, sondern ein Wunsch.

Wichtige Werkzeuge

Zur Planung und Steuerung dienen mehrere Werkzeuge:

- **Projektstrukturplan (PSP):** gliedert das Gesamtprojekt „vom Groben ins Feine“ in überschaubare **Arbeitspakete** (der „Was?“-Plan).
- **Projektablaufplan / Terminplan:** legt Reihenfolge und Termine der Arbeitspakete fest, oft als **Gantt-Diagramm** (Balkenplan) mit Abhängigkeiten (der „Wann?“-Plan).
- **Meilensteine:** markieren wichtige, überprüfbare Zwischenergebnisse (z. B. „Konzept abgenommen“).

Beispiel: Im PSP wird „Umzug Lager“ in die Pakete Planung, Regale bestellen, Umbau, Einräumen zerlegt; das Gantt-Diagramm ordnet diese zeitlich mit einem Meilenstein „Lager betriebsbereit“ an.

Merke: PSP beantwortet „Was ist zu tun?“, der Ablaufplan „Wann und in welcher Reihenfolge?“.

Das magische Dreieck

Die drei Zielgrößen **Zeit, Kosten und Qualität (Leistung)** hängen voneinander ab – wird an einer Größe „geschraubt“, wirkt sich das auf die anderen aus. Sie bilden die Ecken eines Dreiecks.

- Schnellere Fertigstellung (weniger **Zeit**) → mehr Personal → höhere **Kosten**.
- Kosten senken → evtl. geringere **Qualität** oder längere Dauer.

Beispiel: Soll ein Software-Rollout einen Monat früher fertig sein, muss die Projektleitung entweder das Budget erhöhen (Überstunden) oder den Funktionsumfang (Qualität) reduzieren.

Merke: Im magischen Dreieck lässt sich keine Ecke ändern, ohne mindestens eine andere zu beeinflussen.

Risiken und Rollen im Projekt

Projekte scheitern selten an der Technik, sondern an unklaren Zuständigkeiten und übersehenen Risiken.

Typische **Rollen**:

- **Auftraggeber:** gibt Ziel und Budget vor, nimmt ab.
- **Projektleitung:** plant, steuert, verantwortet Termine/Kosten.
- **Projektteam:** erledigt die Arbeitspakete.
- **Lenkungsausschuss:** entscheidet bei großen Weichenstellungen.

Risikomanagement: Risiken früh erkennen, bewerten (Eintrittswahrscheinlichkeit × Schaden) und Gegenmaßnahmen festlegen.

Beispiel: Risiko „Schlüssellieferant fällt aus“ wird als hoch bewertet → Gegenmaßnahme: zweiten Lieferanten vorhalten.

Merke: Klare Rollen und frühzeitiges Risikomanagement entscheiden oft mehr über den Projekterfolg als der Zeitplan selbst.

Eselsbrücken

- Phasen 'DePlanDA': Definition - Planung - Durchführung - Abschluss.
- In der Definition steht das Ziel, in der Planung der Plan - 'erst wohin, dann wie'.
- Abschluss = Reflexion: Am Ende schaut man zurück, was gut lief.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Nenne die vier Projektphasen in der richtigen Reihenfolge.
- ☐ In welcher Phase wird das Projektziel formuliert?
- ☐ Was wird in der Planungsphase erstellt?
- ☐ Was geschieht in der Abschlussphase?

Meine Notizen

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde → Unterricht
